Q4 总目标：交付稳定可用的端侧系统

2026 年 10 月 19 日— 12 月 31 日

在 NX 与 M4 上，完成从“全流程能跑”到“稳定运行、体验可用、结果可验证”的工程化交付。

稳定工程系统

可部署、可观测、可恢复
模型与任务运行受控

完整使用闭环

视频证据与记忆修订可用
文字、音频按最小范围补齐


可验证的交付

1167QA ＋长视频专项
模型包、接口、文档与验收证据

主线： NX / M4 稳定系统 ＋ 可复现模型与接口 ＋ 完整评测和交付证据

系统流程：从多模态输入到有据可查的回答

主数据流贯通理解、记忆与召回；纠错、删除和生命周期形成反馈闭环。

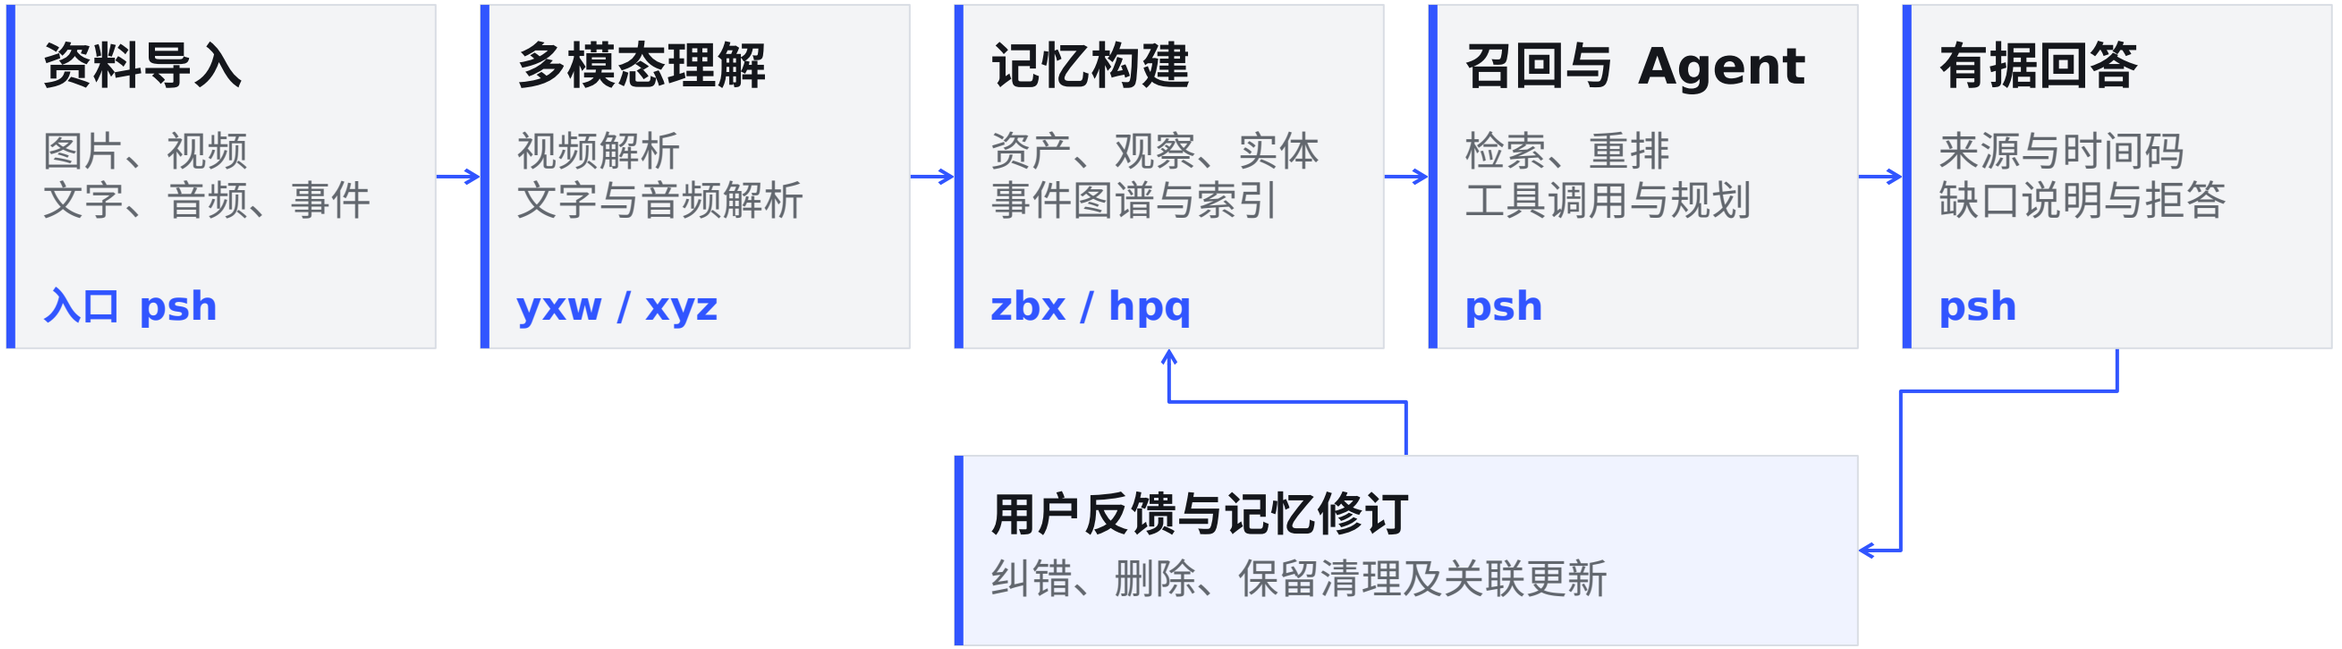

模型优化
ljh / pyp / lcl

运行时与端侧
lyc / zyq

评测与回归
xy / ly

技术架构与负责人

应用接入、记忆能力、模型服务和运行底座分层协作，按统一版本集成。

交互入口 / SDK / API / Agent
psh

多模态解析
视频 yxw
文字、音频、事件 xyz

记忆写入与关联
资产观察 zbx
事件图谱 hpq

召回与证据
混合检索、规划、拒答
psh

模型服务
量化 ljh / 剪枝 pyp / 训练 lcl

主线集成
psh

编排、恢复与 NX
lyc

适配、资源与 M4
zyq

横向评测

Benchmark xy

长视频 ly/yxw

自动对比与回归
质量、资源和长稳
使用场景与交付检查

四项核心工作与明确产出

以稳定工程系统为主线，每项工作同时提交可用能力与验证证据。

核心工作	本季形成的能力	可检查产出
系统工程化	主线集成、服务编排、恢复与资源控制	NX/M4 安装包、运行配置、长稳及恢复报告
理解与记忆闭环	视频回源、可靠写入、纠错删除与召回	来源链、事件图谱、生命周期及跨模态用例
模型能力提升	量化、剪枝、训练独立验证有效收益	可复现模型包、消融报告、设备实测结果
评测与开发交付	统一版本、自动对比、长视频和开发接口	QA 及专项报告、 SDK/API 、部署维护包

Q4 暂不开展权限功能；文字、音频和设备事件按冻结的最小范围补齐。

五个里程碑，11 周推进到正式交付

各阶段退出条件对应 Excel；颜色表示计划阶段，不表示已完成。

里程碑 / 截止日期	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11
M0 基线与范围冻结 10 月 23 日	基线										
M1 工程主链可控运行 11 月 6 日		工程版 v0.1									
M2 记忆治理与稳定运行 11 月 27 日				稳定版 v0.2							
M3 完整候选版验收 12 月 18 日							候选版 RC1				
M4 正式交付 12 月 31 日										正式版 v1.0	

12 月 11 日冻结功能、模型和配置； 24 / 72 / 168 小时为建议测试梯度， M0 冻结负载和通过门槛。

分工：模型与端侧工程

量化、剪枝、训练分别验证；运行时与设备适配划清执行边界。

学生	主要责任	季度交付
ljh	模型量化	精度 / 格式方案、可部署模型与质量 / 资源对比
pyp	模型剪枝	剪枝结构、恢复方案及真实设备收益验证
lcl	模型训练	训练数据与脚本、权重、保留集与能力恢复报告
zyq	端侧适配牵头、 M4 、资源策略	双平台规范、 M4 部署与长稳、预算及降级策略
lyc	服务编排、异常恢复、 NX	模型起停、健康检查、持久化恢复及 NX 验证

候选模型必须同时说明质量、时延、内存和稳定收益；无收益的实验保留结论。

分工：记忆闭环与验证交付

记忆构建按人拆开；召回、长视频与主评测分别负责。

学生	主要责任	季度交付
psh	主线集成、召回、 Agent 、交互与接口	统一发布版、召回策略、 SDK/API 与示例
zbx	资产、观察、实体与权威写入	写入结构、去重、来源与一致性工具
hpq	事件图谱、关联与生命周期	事件关联、删除传播、保留清理与恢复
yxw	视频理解与来源链	抽帧解析、源片 / 片段 / 时间码与视频配置
xyz	文字、音频与事件接入	最小输入链、原文 / 转写证据与接入说明
xy	Benchmark 、自动与使用回归	同版对比、问题闭环与最终验收包
ly	长视频 Benchmark	视频集、时间码 GT 、 QA 与专项报告

M0 与 M1 每周交付

10 月 19 日至 11 月 6 日。先冻结基线，再形成可部署、可恢复的工程版。 日期均为北京时间。

周次	本周主要交付	主要责任人
W1 10 月 19 日至 23 日	范围、配置、输入契约与评测基线	psh 牵头集成，各学生冻结模块基线
W2 10 月 26 日至 30 日	部署观测、模型控制、恢复和视频来源	psh 、 lyc 、 zyq 、 yxw
W3 11 月 2 日至 6 日	工程版、自动回归与 24 小时测试	psh 集成， xy 回归

阶段退出条件 **部署和恢复可复现，各基础模块集成完毕，基线稳定。**

M2 每周交付

11 月 9 日至 27 日。记忆生命周期、资源调度和首轮有效优化收敛。 日期均为北京时间。

周次	本周主要交付	主要责任人
W4 11 月 9 日至 13 日	纠错删除、图谱、长视频及使用回归	zbx 、 hpq 、 psh 、 ly 、 xy
W5 11 月 16 日至 20 日	量化剪枝训练、召回与资源联合优化	模型组、 psh 、 zyq 、 lyc
W6 11 月 23 日至 27 日	稳定版、 72 小时与增量范围预验	psh 集成； xy 回归； xyz 预验

阶段退出条件 **治理、质量和使用回归通过， NX/M4 完成 72 小时验证。**

M3 每周交付

11 月 30 日至 12 月 18 日。整合最小增量模态，冻结候选版并执行完整验证。

周次	本周主要交付	主要责任人
W7 11 月 30 日至 12 月 4 日	文字音频事件接入、模型与开发接口	xyz 、 zbx 、 hpq 、 psh 及模型组
W8 12 月 7 日至 11 日	冻结功能模型，启动 168 小时测试	psh 、 xy 、 zyq 、 lyc
W9 12 月 14 日至 18 日	完整回归、长视频与候选版复测	xy 、 ly ；各模块修复遗留问题

阶段退出条件 **12 月 11 日冻结；完整回归和 168 小时完成**

M4 每周交付

12 月 21 日至 31 日。修复、安装演练、交付及季度最终验收。 日期均为北京时间。

周次	本周主要交付	主要责任人
W10 12 月 21 日至 25 日	独立部署、升级回滚与受影响重测	psh 、 lyc 、 zyq 、 xy
W11 12 月 28 日至 31 日	正式发布、资料归档与团队接手	各学生提交，汇总最终验收包

阶段退出条件 **完成交付与证据， wlq 参与 12 月 31 日最终验收。**

四个检查面，形成最终验收证据

学生完成开发、复核与资料汇总； wlq 仅参加季度最终验收。

检查面	必须证明	学生准备的证据
记忆质量	写入正确，召回有据，纠错删除生效	逐题结果、来源核验与生命周期用例
资源与稳定	负载可控，失败可恢复， NX/M4 持续运行	时延、内存、温度、功耗及降级恢复记录
使用体验	核心操作完成，进度与失败反馈清楚	xy 组织场景实测，各模块修复并复测
可复现交付	他人能部署、调用、升级回滚和维护	模型包、开发接口、维护及接手记录

12 月 31 日：版本、产物与证据一致，通过最终验收后完成 Q4 交付。

推进机制：学生交付，项目协调，最终验收

每周明确产物、依赖、证据和问题责任；执行明细以配套 Excel 为准。

周一 · 明确任务

本周产物、依赖
检查条件与可投入时间

各学生负责人

周四 · 集成联调

代码、模型、配置
接口与部署说明同步

各模块联调

周五 · 检查闭环

同版评测、使用回归
缺陷与证据进入台账

交叉复核

ysh · 项目协调

跟踪进度、协调资源与跨组阻塞

wlq · 最终验收

12 月 31 日核验季度交付与验收证据

11 周任务包 → NX / M4 稳定系统与可复现交付

Q4 指标制定
